


格聂黑帐篷 4 月份考察报告

项目考察基本信息

时间：2023.4.15-2023.4.25

考察团队：王硕、昕霖、东州

考察地点：四川阿坝州毛儿盖、红原县，甘孜州甘孜县、理塘县、然日卡（总路线 2064 公里）

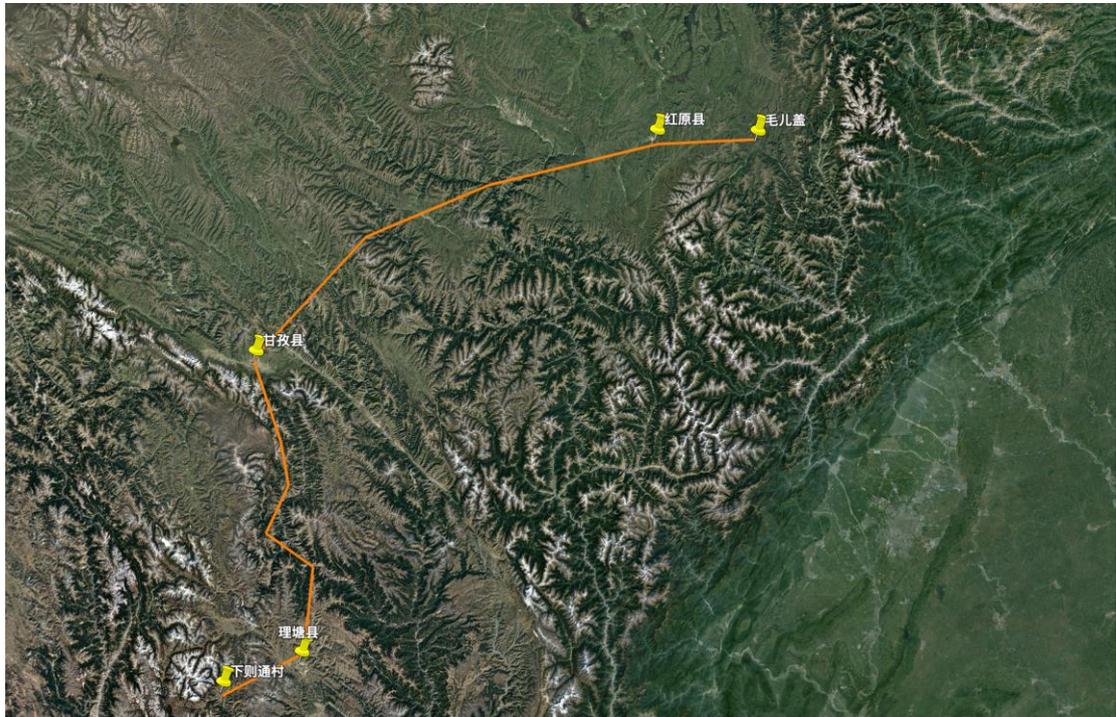

设计师黑帐篷考察

4.15-17 松潘 毛儿盖

从头开始拆解、搭建、使用、收起黑帐篷，测量体积。

体验当下牧民的生活状况、了解游牧到定居的变迁过程。



时长：一小时（7人协作），20人大小帐篷

4.18 红原县

与红原县文史抢救小组负责人了解黑帐篷、牦牛毛纺织手工艺的过去和现状。（牦牛毡防水性好）



4.19 甘孜县

了解甘孜县打本二村的超大黑帐篷、了解结构并测量。(高 4 米多，长 10 米，70-80 人，寺院用)



4.22 然日卡村

了解然日卡本地的黑帐篷（哇巴）制作工艺。与老爷爷了解了村庄的变迁过程。



4.25 理塘县

王硕与东州考察理塘县的黑帐篷布等所需材料

黑帐篷布 50 米 215 元（宽 27-30cm）。1.75（臂长）X8（臂长长）=14m x 17（片）

牦牛毛绳一斤 15 元、小工 200 元/天

7.1 前完成试运营状态，7.20 挪到耍坝子位置等待扶轮社进场

格聂村两委协商

4.21 然日卡村


与村长见面交谈

（1）垃圾问题

去年村里自己雇佣挖掘机把垃圾场给填埋，现在既没有堆放垃圾的场所，也没有运输垃圾的车辆。

现在垃圾是自家在傍晚或者早晨趁政府不监督时间焚烧垃圾，垃圾处理问题依然存在。

今年继续希望能给他们提供一个垃圾车。

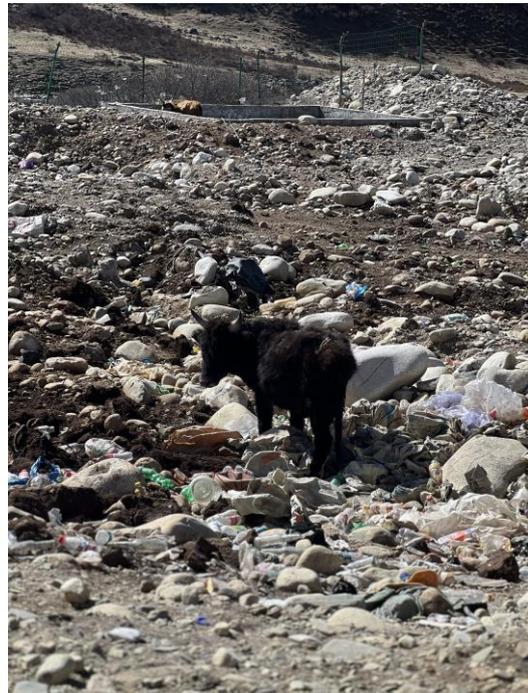

(2) 黑帐篷项目

了解了村里有政府投资的 400 万的烂尾民宿，也有 1200 万投资修建博物馆等旅游开发设施。

大家有想过丁真热度减少之后可能没有这么多游客，但是没有什么更好的办法。
黑帐篷运营以及未来的计划给村长讲清楚了，他表示非常好，也会全力配合。

4.22 然日卡村

与村民交谈

人数-20 人左右

交谈内容

村民们基于这两年的游客数量庞大、认为这两年也有更多的游客进来，所以大量修建民宿。

目前除了吃住以外的旅游消费，主要有骑摩托、骑马、徒步带游客去各个景点、泡温泉、跳锅庄。

缺乏深度体验内容

村民认为现在旅游开发面临的一个最大问题是路没有修好。

-与村民解释清楚了黑帐篷的整个计划，也说清楚了这个项目需要双方共同努力才能完成，村民表示非常喜欢这个项目，希望能够持续的做下去。

-在场的年轻人也特别喜欢这个项目，希望能够参与进来。

-村民希望黑帐篷项目可以结合旅游发展和民宿生意，实现互惠共赢。

村长表示 5.1-6.15 中间在挖虫草期间做不了什么事，6.15-7.20 之间可以做（民宿、汉语）培训、也可以做黑帐篷。帐篷可以运营的时间是从 6 月至 10 月份。黑帐篷修建事情由他们村委会六个人负责，把要求明确提给村长就行。



4.23 日青年课程共创和运营讨论

1, 与设计师确定帐篷功能平面图与内装家具计划

2, 与青年代表亚皮探讨课程主题和运营方案

课程设计:

-考虑以牦牛为主线设计课程模块, 结合内装展陈 (酥油, 虫草, 服装, 放牛, 黑帐篷, 游牧生活)

-神山主题课 (神山名字, 意义, 转山煨桑传统, 互动活动堆叠玛尼石拍照留念)

-格聂负责任旅行地图游戏 (结合格聂 101 教案)

-动手体验 (藏装拍照, 体验编织, 印经幡)

考虑当地青年汉语与代课水平, 需要前期进行语言表达培训。

项目推荐:

与抖音天团策划线上预热, 内容策划, 共同预热黑帐篷项目与内容 (需要具体出计划)

扶轮社:

垃圾问题如何参与

7月到社区的计划表 (4天行程)

运营:

目前然日卡有一个带游客的轮班群, 游客进来会分配一个向导, 负责几日活动与个人安全。

黑帐篷运营可以考虑模仿已有组织模式, 设立 3-5 人团队, 轮班上课, 课程标准化。

-可以考虑课程衔接户外旅游参观项目, 增加村集体收入

-考虑与然日卡抖音天团合作, 以课程内容策划抖音视频内容, 让黑帐篷在没有开启之前已经有线上流量。



问题：

-然日卡失去丁真流量之后的客户群体是谁？

-我们的课程授课对象是谁？

-黑帐篷的运营要跟村里的民宿和旅游业形成紧密良好的互动，否则青年都会忙着接待客人，黑帐篷运营会无人照顾。

-村里积极配合的原因之一是希望我们可以帮助解决垃圾问题，我们已经表达无法一次性完全解决，但愿意与村民一起想办法。



下一步计划

黑帐篷制作-王硕、东州

5.1 假期之后王硕出帐篷的具体尺寸。

6.20 号前买好黑帐篷布和绳子

6.20 号进社区开始缝制黑帐篷（村长建议动员 10 人左右，最多在 4 天内完成，一人每天工钱 200 元）

7.1 号制作完黑帐篷进内装、开始试运营。

7.20 号左右上慈进社区、把帐篷搬到耍坝子的地方重新搭建。



黑帐篷内装-听霖、东州

内装分两批进行采购-试运营、正式运营

试运营内装

5.15 号之前确定好基本内装物件之后开始制作（先不采购）

6.15 号采购、制作完内装物件

帐篷搭建完试运营之后查缺补漏一部分

正式运营内装

试运营 7 月 1 日

试运营 10 天之后开始逐渐查缺补漏、填充物资

课程、培训

运营计划

6.20 之前出一个更具体的运营计划与村里协商确定好
